Réseau d'Organisations et d'Associations des Cadres Appliqués pour le Développement d'Haïti(ROACADH)

28, Rue Sacré-Cœur – Haut Caracolie

Rapport projet de réhabilitation de l'école des Anges du ciel suite au passage de l'ouragan Matthew

Commune de Jérémie – Département de la Grande Anse

L'école des Anges du ciel après le passage de l'ouragan Matthew

I- Contexte

L'école des Anges du ciel se trouve dans la 5ème section communale de Jérémie, Ravine-à-Charles. L'école a été fondée en octobre 1998 dans le but de réduire le taux d'analphabétisme dans la section communale. L'établissement compte sept salles, à raison de 18m^2 chacune, dont six salles de classe, la direction et une galerie. La toiture était faite de tôles ondulées et les murs de roches et de mortier.

Le passage de l'ouragan Matthew a gravement endommagé le patrimoine bâti de la Grand'Anse avec 80% à 90% des biens endommagés ont détruit. Parmi les pertes, l'école des Anges du ciel avec la toiture complètement détruite, des murs qui se sont effondrés et les livres, cahiers et autre matériel scolaire perdu. Au vu de cette situation, l'école a été dans l'impossible de dispenser des cours et cela depuis plus de 5 mois. Cette situation a accru la précarité du système éducatif dans la section communale où l'ensemble des élèves, incluant ceux des autres écoles, n'ont malheureusement pas pu être scolarisé. Afin de pouvoir scolariser à nouveau les enfants de la section communale, la réhabilitation des bâtiments est devenue une priorité. Le présent projet visait justement la réhabilitation de l'une de ces écoles rurales de la 5ème section communale de Jérémie.

Répartition des élèves au sein de l'école des Anges du Ciel – année scolaire 2016-2017

Niveau	**Garçons**	**filles**	**Total**
1ère année	19	27	46
2ème année	16	20	36
3ème année	17	22	39
4ème année	21	23	44
5ème année	20	22	42
6ème année	21	24	45
total	***114***	***138***	***252***

II- Objectifs

a) Objectif général

Réhabiliter une petite école rurale, l'école des Anges du Ciel, située à Ravine-à-Charles, 5ème section communale de Jérémie

b) Objectifs spécifique

- Favoriser le retour à l'école des enfants de la zone. La reconstruction de l'école est la première des priorités pour y parvenir
- Permettre à l'école l'ange du ciel d'accueillir ses élèves

III- Réalisation

Pour rendre possible ce projet, une fois la population informée, les achats des matériaux ainsi que le choix de la main-d'œuvre ont effectué le jeudi 2 et vendredi 3 février 2017. Une équipe composée de 3 ouvriers qualifiés et de 4 aides a été engagée. L'ensemble des travaux coordonné a été supervisé par un comité de 3 membres de l'école des Anges du Ciel. C'est ce comité qui a eu la responsabilité du projet et qui répond de la pleine et entière réalisation du projet. Les travaux préparatoires incluant des nettoyages ont été réalisés ce même jeudi 2 février 2017. A la suite des problèmes liés à des intempéries, les travaux de transports ont du être repoussé pour n'être réalisé que 18 jours après les achats des matériaux, soit le mercredi 22 février 2017. Il a fallu prendre 3 jours pour acheminer l'ensemble du matériel. Immédiatement après avoir transporté les matériaux, les travaux de réhabilitation ont pu commencer. La réalisation des travaux s'est faite sur une durée de quatre (4) semaines à raison de six jours par semaine.

IV- Contraintes

La durée du projet était initialement prévue pour quatre semaines. Cependant pendant et après la période d'achat, des pluies se sont abattues pendant environ 12 jours sur la commune de Jérémie, principalement dans la 5ème section, Ravine à Charles. Il a fallu encore attendre une semaine de soleil pour transporter le matériel, la route reliant la ville de Jérémie à la 5ème section communale restant très précaire après le passage de l'ouragan Matthew. Ainsi, une vingtaine de jours ont été ajoutés à notre calendrier initial.

V- Résultats du projet

Suite aux travaux, nous avons pu :

- Réparer la toiture de l'école des Anges du Ciel ;
- Rouvrir les classes dans les jours qui viennent pour poursuivre la scolarisation d'une partie des enfants de la zone.

VI- Décompte financier

Rubrique	Quantité	Prix unitaire	Dépenses réelles HTG	Dépenses budgétées HTG	Différence
Matériel			***332'600***	***322'100***	***10'500***
Tôles	200 feuilles	930	186'000	180'000	6'000
Ciment	60 sacs	500	33'000	30'000	3'000
Bar de fer 3/8	40 barres	250	10'000	10'000	
Bar de fer 1/4	120 barres	75	9'000	9'000	
Fil à ligature	100 livres	50	5'000	5'000	
Planches	8 douzaines	1'200	9'600	9'600	
Contreplaqués	12 feuilles	1'500	18'000	18'000	
Bois 4/4	5 douzaines	Contribution locale			
Bois 2/4	10 douzaines	Contribution locale			
Lattes	20 douzaines	450	9'000	9'000	
Clous pour tôle	1 caisse	3'000	3'000	2'500	500
Clous 2 ½ pouces	1 caisse	2'500	2'500	2'000	500
Cloue 3 pouces	1 caisse	2'500	2'500	2'000	500
Sable	100 sacs	300	30'000	30'000	
Gravier	50 sacs	300	15'000	15'000	
Autres			***106'000***	***62'000***	***44'000***
Transport	2 camions	20'000	40'000	19'000	21'000
Main d'œuvre	3 ouvriers	14'000	42'000	27'000	15'000
Main d'œuvre	4 aides	6'000	24'000	16'000	

Suivi	Equipe de suivi	Contribution locale			
Total			**438'600**	**384'100**	***54'500***

Les dépenses sont effectuées avec deux taux d'échanges différents une parties avec 67,90 HTG pour 1 USD et une autre avec un taux de change à 68,65 HTG pour 1 USD

***NB** : les fiches de différentes dépenses se trouvent à l'annexe d du présent rapport.*

VII- Conclusion et recommandations

La réhabilitation de l'école des Anges du ciel était l'objectif principal de ROACADH pendant toute la période post-Matthew. Grace à l'aide financière de la fondation main dans la main et l'enthousiasme des populations locales, celle-ci est maintenant en partie réalisée. En effet, pour permettre aux élèves de l'école des Anges du ciel de reprendre le pain de l'instruction le plus vite possible, les travaux initialement prévue ont été entièrement réalisés, soit la reconstruction de la toiture de sept salles de 18m^2 chacune ainsi que la réparation de certains murs.

Suite à la réalisation du réaménagement de l'école, il est fortement recommandé de :

- Augmenter les heures de classes pour que les élèves puissent récupérer leur programme
- Accompagner les élèves avec des cantines pour mieux apprendre durant cette période, et cela d'autant plus que la famine se fait chaque jour de plus en plus sentir dans l'ensemble du département de la Grand'Anse ;
- Accompagner les élèves avec du nouveau matériel scolaire (livres, cahiers, crayons, etc.)

VIII- Annexes

a) Ecole des Anges du ciel après le passage de l'ouragan Matthew

b) *École des Anges du ciel pendant la réalisation des travaux*

c) *Ecole des Anges du ciel après la réalisation du projet*

d) *Fiches décompte financier*

ACHAT / VENTE DE DEVISES
UNIBANK
H 820849
Nom du Client: Nazaire Osée
Adresse :
Monnaie: US$ | Montant: 5000 | Cours: 67.79 | Equivalent en Monnaie Locale: 339.500
NATURE: Espèces / Chèques / Transferts / Virement Interne
DESCRIPTION:
REGLEMENT:
Signature du Client | Préparé par | Approuvé par | Forward autorisé par


ACHAT / VENTE DE DEVISES
UNIBANK
H 0994233
Nom du Client:
Adresse :
Monnaie: G | Montant: 650 | Cours: 68.8 | Equivalent en Monnaie Locale: 44.672
NATURE: Espèces / Chèques / Transferts / Virement Interne
DESCRIPTION:
REGLEMENT:
Signature du Client | Préparé par | Approuvé par | Forward autorisé par

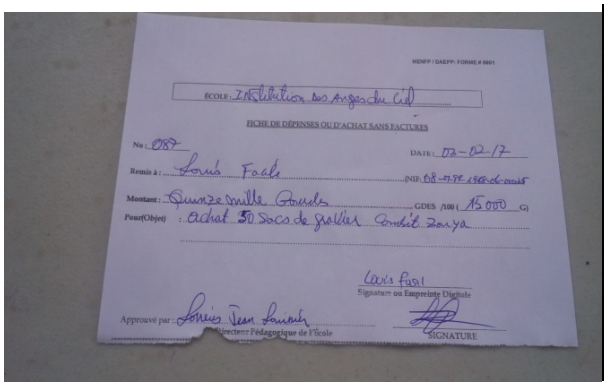
MENFP / DAEPP: FORME # 0001
ÉCOLE: Institution des Anges du Ciel
FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES
No: 087
DATE: 02-02-17
Remis à: Louis Focle
Montant: Quinze mille Gourdes
GDES /100 (15 000 G)
Pour(Objet): Achat 50 sacs de gravier Conseil Zorya
Approuvé par: Joréus Jean Louisin
Directeur Pédagogique de l'École
SIGNATURE

MENFP / DAEPP: FORME # 0001
ÉCOLE: Institution des Anges du Ciel
FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES
No: 089
DATE: 03-02-17
Remis à: Lugueme Marc Louis Jeune
Montant: Neuf mille Gourdes
GDES /100 (9 000 G)
Pour(Objet): 20 douzaines de lattes
Approuvé par: Joréus Jean Louisin
Directeur Pédagogique de l'École
SIGNATURE


ÉCOLE: Institution des Anges du Ciel
FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES
No: 090
DATE: 03-02-17
Remis à: Lugueme Marc Louis Jeune
Montant: Neuf mille six cent Gourdes
GDES /100 (9'600 G)
Pour(Objet): 8 douzaines planches
Approuvé par: Joréus Jean Louisin
Directeur Pédagogique de l'École
SIGNATURE

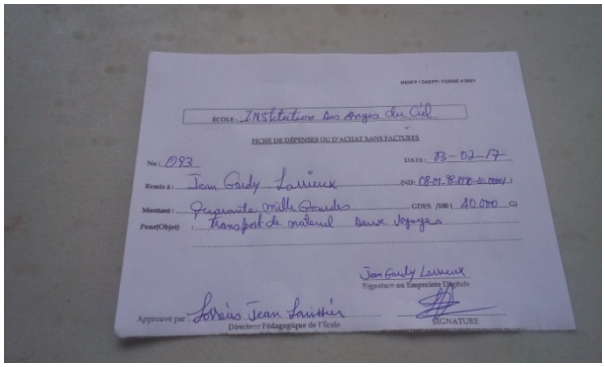
MENFP / DAEPP: FORME # 0001
ÉCOLE: Institution des Anges du Ciel
FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES
No: 083
DATE: 03-02-17
Remis à: Jean Gaudy Lafleur
Montant: Quarante mille Gourdes
GDES /100 (40 000 G)
Pour(Objet): transport de materiel deux voyages
Approuvé par: Joréus Jean Louisin
Directeur Pédagogique de l'École
SIGNATURE



ÉCOLE Institution des Anges du Ciel

FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES

No : 092 DATE : 21-03-2017

Remis à : Lafette Valsaint (NIF: 08-01-78-172-00026)

Montant : Quarante Deux mille Gourdes GDES /100 (42 000 G)

Pour(Objet) : Payroll 2 ouvriers

Lafette Valsaint
Signature ou Empreinte Digitale

Approuvé par : Loriéus Jean-Louisiner
Directeur Pédagogique de l'École

SIGNATURE



MENFP / DASPP. FORME # 0001

ÉCOLE : Institution des Anges du Ciel

FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES

No : 091 DATE : 21-03-2017

Remis à : Charles Nesly (NIF: 08-01-78-172-00014)

Montant : Vingt quatre mille Gourdes GDES /100 (24 000 G)

Pour(Objet) : Payroll quatre ouvriers

Charles Nesly
Signature ou Empreinte Digitale

Approuvé par : Loriéus Jean Louisiner
Directeur Pédagogique de l'École

SIGNATURE



ÉCOLE Institution des Anges du Ciel

FICHE DE DÉPENSES OU D'ACHAT SANS FACTURES

No : 088 DATE : 02-02-17

Remis à : Dorgonlal Ovilus (NIF: 08-01-78-1764-0-000-01)

Montant : Trente mille Gourdes GDES /100 (30 000 G)

Pour(Objet) : Nos sacs de ciment achat

Dorgonlal Ovilus
Signature ou Empreinte Digitale

Approuvé par : Loriéus Jean Louisiner
Directeur Pédagogique de l'École

SIGNATURE

Berthony Matériaux
DE CONSTRUCTION FER DUR
Dame Codo, Jérémie, Haïti
Tél : (509) 3858-3213 / 3228-3361
Prop. Jean Berthony

FICHE DE VENTE

Client Ange du Ciel Date 03 Février 2017

Qté	Descriptions	Px. Unit	Montant
200	Feuilles Tole Galvanisé	930	186 000
12	Feuille Plafond	1500	18 000
01	Caisse Clou Tole	3600	3000
01	Clou Carrés 3 1/2	2500	2500
01	Caisse Clou	2500	2500

Total 212 000

Merci d'avoir passé à nous.

Imprimerie La Perfection : Tél : 3737-9258 / 3255-1004

Jean Berthony
Signature

Berthony Matériaux
DE CONSTRUCTION FER DUR
Vis-à-vis de Radio Jérémie Nouvelle
Tél : (509) 3689-6257
Prop. W. J.

FICHE DE VENTE

Client Cash Date 3-02-17

Qté	Descriptions	Px. Unit	Montant
40	Sacs Ciment		2000
100	Sacs Sable		1500
60	Sacs Ciment		3000
100	Fers Galvanisé		1000

Total 7500
Avance 3000
Reste 4500

Merci d'avoir passé à nous.

Imprimerie La Perfection : Tél : 3737-9258 / 3255-1004

Signature



CADRES APPLIQUES POUR LE DEV. D'HAITI
CARACOLE S.R
Tél.: (509) 3700-3000 / 3755-0000

Jérémie, le 02-03-17 121

Payez ce chèque à l'ordre de NAZAIRE OSEE USD 5000.00

Cinq mille dollars US

UNIBANK S.A.
Succursale 400

Loriéus Jean Louisiner
Jethro Michel

Mémo Achat Matériaux

⑈00001 51⑈ ⑆121130011⑆ 1722014145 26⑈

3/4/17 = 5700 USD



RÉSEAU D'ORGANISATIONS ET D'ASS. DES CADRES APPLIQUES POUR LE DEV. D'HAITI
CARACOLE S.R
Tél.: (509) 3700-3000 / 3755-0000

Jérémie, le 02-03-17 152

Payez ce chèque à l'ordre de Loriéus Jean Louisiner USD 650.00

Six Cent Cinquante dollars US

UNIBANK S.A.
Succursale 400

Loriéus Jean Louisiner
Jethro Michel

Mémo Construction Anges du Ciel

⑈00001 52⑈ ⑆121130011⑆ 1722014145 26⑈
